

भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, भरतपुर, चितवन

आ.ब. २०७१/०७२को वार्षिक प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमि:

भरतपुर उप-महानगरपालिका उच्च जनसंख्या वृद्धि भएको नगर हो । साविक भरतपुर नगरपालिका (वडा नम्बर १-१४)मा नेपाल सरकारले आ.ब. २०७१/०७२ मा ५ गा.वि.स.हरु मंगलपुर, फुलवारी, गितानगर, शिवनगर र पटिहानी लाई गाभेर भरतपुर उप-महानगरपालिका घोषणा गरेपश्चात यस उप-महानगरपालिकामा २९ वटा वडाहरु छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार २०६८ आषाढ मसान्तको भरतपुर उप-महानगरपालिका (वडा नं. १-१४) को घरसंख्या २४,१४३, जनसंख्या १,४३,८३६ र वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ४.७६ थियो । त्यसैगरी थप भएका ५ गा.वि.स. हरुको २०६८ आषाढ मसान्त सम्मको घरसंख्या ११,७९१, जनसंख्या ५६,०३१ र वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर १.५१ थियो । उल्लेखित जनसंख्या वृद्धिदर अनुसार प्रक्षेपण गर्दा २०७२ आषाढ सम्मको भरतपुर उप-महानगरपालिकाको कुल जनसंख्या २,३९,२९२ र घर संख्या ४१,८०५ हुन आउँछ ।

भरतपुरमा जुगेडि खोलावाट खानेपानी आपूर्तिको शुरुवात खानेपानी तथा ढल निकास विभागवाट वि.सं. २०३३ देखि शुरु भएको हो । जापान सरकारको सहयोगमा वि.सं. २०५० सालमा डुइवटा ट्यूबवेल, रामनगर फिल्टर प्लाण्ट, १६०० घ.मी.को पानीपोखरी र थप वितरण लाईन निर्माण गरि आयोजनाको सुधार विस्तार गरियो । यो आयोजना वि.सं. २०५६ श्रावण १ गतेदेखि नेपाल खानेपानी संस्थान भरतपुर शाखालाई हस्तान्तरण गरियो । वि.सं.२०६१मा जुगेडी सिष्टम बाढिवाट क्षतिग्रस्त भई रामनगर र देवघाट क्षेत्रको सेवा बन्द भयो । संस्थानले त्यसको मर्मत संभार गर्न र समयानुकूल सेवा प्रणालीको विस्तार गर्न सकेन । सेवा विस्तारको लागि भरतपुर उप-महानगरपालिकाले खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड मार्फत खानेपानी सेवा सञ्चालन गर्ने र सरकारले खानेपानी संस्थान भरतपुर शाखाको सम्पत्ति तथा दायित्व भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा हस्तान्तरण गराईदिने गरि शहरी तथा वातावरणीय सुधार परियोजना (Urban and Environmental Improvement Project, UEIP) अन्तर्गत नेपाल सरकारको ऋण तथा अनुदानमा भरतपुर खानेपानी आयोजनाका नयां संरचनाहरुको निर्माण कार्य गरिएको हो । यो आयोजना आ.ब. २०६२/०६३ मा शुरु भई आ.ब.२०६७/०६८ मा सम्पन्न भएको हो ।

२. भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको गठन:

उद्देश्य,कार्यक्षेत्र तथा बोर्डको गठन: खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन २०६३ले उप-महानगरपालिका क्षेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाई सेवालालाई नियमित, व्यवस्थित, गुणस्तरयुक्त र सुलभ बनाई यस क्षेत्रका बासिन्दालाई भरपर्दो सेवा प्रदान गर्ने गराउने उद्देश्यले सम्बन्धित नगरपालिकाको परामर्शमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरि नेपाल सरकारलाई खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । बोर्ड अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संगठित संस्था रहने व्यवस्था छ । भरतपुर नगरपालिकाको सिफारिसमा बोर्ड ऐन २०६३को दफा ५(१) बमोजिम नेपाल सरकार भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय (माननिय मन्त्रिस्तर)को मिति २०६४/०५/३१ को निर्णय अनुसार भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन भएको हो । नेपाल सरकारले मिति २०६७/०१/०६को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि सम्पूर्ण भरतपुर नगरपालिका क्षेत्रलाई बोर्डको कार्यक्षेत्र तोकेको छ । सरकारले भरतपुरलाई उप-महानगरपालिका घोषणा गरे पश्चात यस उप-महानगरपालिकाको सम्पूर्ण क्षेत्र यस बोर्डको कार्यक्षेत्र हुन गएको छ । बोर्डले नेपाल सरकारसँग भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय (हाल सहरी विकास मन्त्रालय) मार्फत सम्पर्क गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कार्यसमिति सम्बन्धि व्यवस्था: खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन २०६३ ले बोर्डको कार्यकारी समितिमा भरतपुर उप-महानगरपालिकाको प्रमुख-१, स्थानिय उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष-१, नेपाल सरकारको प्रतिनिधि-१, गरि ३ जना पदेन सदस्य र बोर्डबाट मनोनित स्थानीय उपभोक्ता संघको अध्यक्ष-१, खानेपानी क्षेत्रमा कार्यरत गैर सरकारी संस्थाको प्रतिनिधि-१, र सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ सदस्य-१ गरि ३ जना मनोनित सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय चितवनका प्रमुखलाई बोर्ड सदस्य तोकेको छ । मनोनित सदस्यहरुको पदावधि चार वर्षको हुने र सदस्यहरुमध्येबाट अध्यक्षको चयन गर्ने, बोर्डले कार्यकारी निर्देशक प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गरि नियुक्ति गर्ने र निजले बोर्डको सचिव भई काम गर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

वर्तमान कार्यसमितिका सदस्यहरु:

पदेन सदस्यहरु:

- अध्यक्ष: भरतपुर उप-महानगरपालिकाका प्रमुख, श्री महेश बराल
- सदस्य: स्थानिय उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष, श्री कल्याण जोशी
- सदस्य: खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय चितवनका डिभिजन प्रमुख, श्री चक्रपाणी शर्मा आचार्य

मनोनित सदस्यहरू:

- घ) सदस्य: स्थानीय उपभोक्ताका संघको तर्फबाट प्रतिनिधि: श्री रामराज पौडेल (बोर्डको मिति २०६९/११/२२को बैठकबाट मनोनित)
- ङ) सदस्य (खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा कार्यरत गैर सरकारी संस्थाको तर्फबाट प्रतिनिधि): श्री बद्रि प्रसाद अधिकारी (बोर्डको मिति २०७०/११/११को बैठकबाट मनोनित)
- च) सदस्य (खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रको विज्ञ सदस्य): श्री रजनी शाह (मल्ल), खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रको विज्ञ(बोर्डको मिति २०७०/०२/०७ को बैठकबाट मनोनित)
- छ) कार्यकारी निर्देशक: श्री शालिकराम पौडेल (मिति २०६७ माघ ४ गते देखिहाल सम्म, बोर्डको अनुरोधमा नेपाल सरकारले काजमा खटाएको)

३. शुरुदेखि हालसम्म बोर्डले गरेका मुख्य नीतिगत एवं ब्यवस्थापकिय कार्यहरू:

- भरतपुर खानेपानी ब्यवस्थापन बोर्ड नियमावली, २०६६ तयार गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको
- “कर्मचारी प्रशासन विनियमावली २०६९” र “आर्थिक प्रशासन विनियमावली २०६९” तयार गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको
- मिति २०६९/०५/२०मा नेपाल खानेपानी संस्थान भरतपुर शाखाको सम्पत्ती तथा दायित्व बोर्डमा हस्तान्तरण गरि लिएको
- जनश्रमदान बापत तत्कालको लागि भरतपुर उप-महानगरपालिकाले बोर्डलाई उपलब्ध गराएको सापटी रकम रु. २ करोड १० लाख १५ हजार र शुरुको सापटी रु. १ लाख गरी जम्मा रु. २ करोड ११ लाख १५ हजार नगरपालीकालाई फिर्ता गरिएको
- बोर्डको कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६९ बमोजिम पदपुर्ति समिति गठन भएको
- खानेपानी महशुल निर्धारण आयोग मार्फत नयाँ महशुल तथा सेवा शुल्कहरु निर्धारण गरी मिति २०७० फागुन १ गतेदेखि लागु गरिएको
- बोर्डको वार्षिक बजेट, कार्यक्रम, प्रगति, आम्दामी, खर्च, लेखा परिक्षण प्रतिवेदन समावेश गरिएको वार्षिक प्रतिवेदन नियमित रुपमा सहरी विकास मन्त्रालयमा पठाईएको, उल्लेखित सबै प्रतिवेदनहरु बोर्डको वेबसाईट www.bwsmb.org.np मा राखिएको
- कर्मचारीहरुको विद्युतिय हाजीरी प्रणाली लागु गरिएको
- बोर्डको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरिएको
- कर्मचारी पदपुर्ति सम्बन्धि निर्देशिका तयार भई स्वीकृत भएको
- कर्मचारी पदपुर्तिको लागि पाठ्यक्रम, पदपुर्ति सम्बन्धि निर्देशिका आदी तयार भई स्वीकृत दरबन्दीमा १ जना ईन्जिनियर (सातौँ तह) र १ जना सहायक प्रशासन अधिकृत (छैटौँ तह) गरी २ जना कर्मचारी स्थायी नियुक्ती गरिएको ।

क्षमता विस्तार:

- प्रेमबस्ती, नारायणपुर, गौरीगंज, तोरीखेत, कैलासनगर, आनन्दपुर र धनगाडामा भ.उ.म.न.पा. तथा स्थानीय उपभोक्ताहरुसंगको सहकार्यमा नयाँ खानेपानी प्रणालीहरु निर्माण शुरु गरेको
- उपभोक्ताहरुको सहयोगमा यस बोर्डलाई ७ कट्टा जग्गा निशुल्क प्राप्त भएको र ३ कट्टा जग्गा खरिद गरिएको
- नयाँ सेवा क्षेत्रमा ५ वटा र पुरानो सेवा क्षेत्रमा ४ गरि जम्मा ९ वटा डिप ट्युबवेलहरुको निर्माण गरिएको
- दैनिक पानी उत्पादन क्षमता १ करोड ५० लाख लिटरबाट ३ करोड पुऱ्याईएको
- पुरानो प्रणालीभित्र ७१ कि.मी. र नयाँ प्रणालीमा ८१.५ कि.मी. गरि जम्मा १५२.५ कि.मि. थप वितरण लाईन निर्माण गरिएको
- वितरण लाईन भएका स्थानहरुमा ग्राहकले मागेकै दिनमा धारा स्वीकृत गरि सुख्खा समयमा ४,५ दिन भित्र र अन्य समयमा १,२ दिन भित्रमा नयाँ धारा जडान गरिदै आएको

चुहावट नियन्त्रण:

- पानी दुरुपयोग गर्ने ग्राहकहरुमध्ये आ.व. २०६९/०७० मा १४० जनाबाट रु.१२,४०,५९९.०० आ.व. २०७०/०७१मा २० जनाबाट रु.७१,४८०.०० र आ.व. २०७१/०७२ मा २० जनाबाट रु. १ लाख २५ हजार ५१०.०० गरि जम्मा १७० जनाबाट रु. १४,३१,५८९.०० थप महशुल संकलन गरिएको
- मिटर नभएका ग्राहकको संख्या १२०० बाट १०० मा भारीएको, शत प्रतिशत मिटरिड गर्ने उद्देश्य हुँदाहुँदै केहि सरकारी कार्यालयले मिटर राख्न नचाहेकोले १००% मिटरिड हुन नसकेको
- सबै ग्राहकहरु नम्बरिड गरिएकोले मिटर रिडिड कार्य बढि प्रभावकारी (Efficient) भएको

- उल्लेखित प्रयास स्वरूप बोर्डले सेवा प्रणाली लिएको समयमा चुहावट दर ३८% बाट यस आ.व.को अन्तसम्म ३० % मा झरेको छ, प्राविधिक कारणले सामान्यतः चुहावट दर २०%भन्दा कम गर्न सकिदैन

४. शहरी तथा वातावरणीय सुधार परियोजना अन्तर्गत निर्माण भएको प्रणालीको खर्च तथा ऋण सम्बन्धि संक्षिप्त विवरण:

- आयोजनाको कूल खर्च: रु. २६ करोड २६ लाख ८८ हजार
 - ✓ नेपाल सरकारको अनुदान: रु. १६ करोड २८ लाख ६६ हजार
 - ✓ भरतपुर नगरपालिकाले नेपाल सरकारबाट प्राप्त ऋण: रु. ७ करोड ८८ लाख ६ हजार
 - ✓ जनश्रमदान बापत बोर्डले उपभोक्ताबाट संकलन गर्नुपर्ने रकम मध्ये भरतपुर उप-महानगरपालिकाले बोर्डलाई उपलब्ध गराएको सापटी रकम: २ करोड १० लाख १५ हजार (यो रकम फिर्ता भईसकेको)
- यो प्रणाली बोर्डबाट संचालन हुँदै आएको छ । विधिवत रुपमा नगरपालिकाबाट हस्तान्तरण भई सकेको छैन । बोर्डले सेवा प्रणालीसंग जोडिएको ऋण तिर्ने प्रतिबद्धता सहितको संभौताको ड्राफ्ट तयार गरि भरतपुर नगरपालिकालाई पठाईसकेको छ ।

५. खानेपानीसेवा प्रणालीको संक्षिप्त विवरण:

यस बोर्ड अन्तर्गत तालिका नं. १ अनुसार संस्थानबाट प्राप्त १२ करोड २८ लाख ८३ हजार, भ.न.पा.को **UEIP Project** बाट प्राप्त २४ करोड ९१ लाख ६३ हजार र बोर्डले आफ्नो आन्तरिक श्रोत र अन्य सहयोगी संस्थाको सहयोगमा निर्माण गरेको ९ करोड १० लाख ४१ हजार गरी जम्मा रु. **४६ करोड ३० लाख ८८ हजार** वरावरको सम्पत्ती छ । उक्त सम्पत्ती संगै रु. **७ करोड ८८ लाख ०६ हजार** वरावरको ऋणको साँवा तथा ब्याजको दायित्व छ ।

तालिका नं. १ : भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले संचालन गरेको सेवा प्रणालीको विवरण

विवरण	नेपाल खानेपानी संस्थानबाट प्राप्त	भ.उ.म.न.पा.बाट प्राप्त (UEIP Project)	बोर्डबाट निर्माण गरिएको (बोर्ड, भ.उ.म.न.पा., उ.स. र अन्य सहयोगमा)	जम्मा	कैफियत
डिप ट्यूबवेल	८ वटा	५ वटा,	९ वटा,	२२ वटा,	
जेनेरेटर	१ सेट (१००के.भि.ए.)	३ सेट (१००के.भि.ए.२, १८० के.भि.ए. १)	१ सेट (८२.५ के.भि.ए.)	५ सेट (१००के.भि.ए.३, १८० के.भि.ए. १ ८२.५ के.भि.ए. १))	
पानी पोखरीको संख्या र क्षमता	२ वटा ४००घ.मी. ओभरहेड १, १२००घ.मी. जमिन (१)	३ वटा (४५०घ.मी. ओभरहेड १, ९००घ.मी. जमिन १, १०००घ.मी. जमिन १)		५ वटा ३९५० घ.मी. (८५०घ.मी. ओभरहेड , ३१००घ.मी. जमिन)	
कार्यालय भवन	२ वटा		१ वटा	३ वटा	
पाइपलाईनको लम्बाइ	७८ कि.मी.(DI, GI, HDPE)	२१४ कि.मी (HDPE)	१५२.५ कि.मि.	४४४.५ कि.मि.	
स्थिर सम्पत्तीको मूल्य, रु. (२०७२आषाढ मसान्तको मुल्यमा)	१२,२८,८३,०५३ .००	२४,९१,६३,७९२.००	९,१०,४१,४५३.००	४६,३०,८८,२९८.००	ह्रासकट्टी कटाएर

६. भरतपुर नगरपालिकामा वर्तमान खानेपानी सुविधाको स्थिति (२०७२ आषाढ मसान्त सम्मको):

- उपमहानगरपालिकाका करिव ४१,८०५ घरधुरी मध्ये १७,४९० ग्राहक मार्फत १,०४,९४० जनसंख्यालाई बोर्डबाट शुद्ध खानेपानी सेवा पुगेको
- करीब ८०० घरधुरीमा उपभोक्ता समिति मार्फत संचालित स-साना खानेपानी स्कीमहरु(रामनगर, ठिमुरा, देवघाट, जखडीमाई, रोजगार्डेन, कृष्णपुर र बाईसविधा) बाट सेवा पुगेको
- संस्थागत/व्यक्तिगत डिप बोरिङ सहित नगरका करीब ४५ प्रतिशत जनसंख्यालेले डिप बोरिङको शुद्ध पिउने पानीको सुविधा लिएका, करीब १५%ले नेटवर्क भएर पनि सेवा नलिएको, ४० %लाई डिप बोरिङको सुविधा छैन, यसको माग बढ्दो छ
- भरतपुर उपनगरपालिकाको साभेदारीमा विकास गरेका खानेपानी आयोजनाहरु, प्रेमवस्ती, गौरीगंज, तोरीखेत, कैलासनगर, आनन्दपुर र धनगाडा निर्माणकै चरणमा
- प्रेमवस्ती खानेपानी आयोजना आ.व. २०७०/०७१ देखि नेपाल सरकारको जिल्लास्तर आयोजनामा समावेश भई खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयबाट ४५० घ.मी. पानी टंकीको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आ.व. २०७२/०७३मा यसको निर्माण सम्पन्न हुने र यसबाट नगरको तल्लो क्षेत्रको सेवामा उल्लेखनिय सुधार हुनेछ ।
- वार्ड नं. ९, ११ र १२मा धनगाडा खानेपानी आयोजनाको लागि ३ कठ्ठा जग्गा खरिद गरी १ वटा डिप ट्युबवेल, विद्युतीकरण कार्य, लगायत १३ किलो मिटर पाईपलाईन विस्तार गर्ने कार्य सम्पन्न भएको, बोर्डको अनुरोधमा आ.व. २०७२/०७३ देखि यो आयोजना खानेपानी तथा ढल निकास विभागको सह-लगानी आयोजना (७०%नेपाल सरकार र ३०% बोर्ड तथा उपभोक्ता समुदायको)मा समावेश भएको छ ।
- थप भएका वडाहरु (१५-२९) मध्ये मंगलपुर, गीतानगर र फुलबारीको केहि भागमा बोर्डको मौजुदा प्रणाली विस्तार गरि सेवा दिन सकिन्छ । खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयको वार्षिक कार्यक्रममा फुलबारी, शिवनगर र पटिहानी खानेपानी आयोजना समावेश भएका छन् । सम्पूर्ण नगरको खानेपानी व्यवस्थापनमा एकरूपताको लागि बोर्डको समेत सहभागिता रहने गरि उल्लेखित आयोजनाहरु निर्माण गर्ने र आयोजना व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बोर्डले लिनुपर्ने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थाको लागि सहरी विकास मंत्रालयमा लेखि पठाईएको छ ।

७. बोर्डको वर्तमान तथा भावी कार्ययोजना:

सन् २०१७ सम्म सबैलाई आधारभुत स्तरको खानेपानी तथा सरसफाई सुविधा उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको लक्ष अनुसार आफ्नो सेवा क्षेत्रमा आधारभुत वा मध्यम स्तरको खानेपानी तथा सरसफाई सुविधा उपलब्ध गराउनु यस बोर्डको पहिलो दायित्व हो । आफ्नो व्यवस्थापन संयन्त्र समेत पूर्णरूपमा तयार भई नसकेको अवस्थामा आफ्नो श्रोतबाट मात्र उल्लेखित लक्ष हासिल गर्न सम्भव छैन । यसको लागि बोर्डले भरतपुर नगरपालिका, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी तथा ढल निकास विभाग तथा अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरूसँग साभेदारीमा नयाँ आयोजना/कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसै सन्दर्भमा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय चितवन मार्फत सह-लगानीमा आयोजनाका थप निर्माण कार्यहरु संचालन गर्ने गरि कैलासनगर र धनगाडा खानेपानी आयोजनाको सह-लगानी सम्बन्धी प्रस्ताव खानेपानी तथा ढल निकास विभागमा पठाईएको हो । खानेपानी सेवा विस्तारको लागि भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले निम्न अनुसारका कार्यक्रमहरु चरणबद्ध रूपमा संचालन गर्ने कार्यनीति लिएको छ ।

- पाईप लाईन नपुगेका सडकहरुमा आवश्यकता अनुसार हरेक वर्ष पाइप लाईन थप गर्दै जाने
- वडा नं.९, ११ र १२ को केरुङ्गा नाला पुर्वको क्षेत्रलाई समेट्ने गरी धनगाडा खानेपानी आयोजना निर्माण गर्ने
- प्रेमवस्ती , नारायणपुर, गौरीगंज क्षेत्र समेट्ने गरी प्रेमवस्तीमा ओभरहेड टंकी निर्माण गर्ने (खानेपानी डिभिजनको सहयोगमा टंकी निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको)
- उपभोक्ताहरुबाट संचालित स्कीमहरुलाई सम्बन्धित समितिसँग वार्ता गरि बोर्डको स्वामित्वमा ल्याई सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने वा आफै संचालन गर्न चाहेमा प्राविधिक र व्यवस्थापकिय सहयोग गर्ने
- हालको Storage Capacity ज्यादै कम भएकोले आर्थिक श्रोत जुटाएर केहि वर्षभित्र आँपटारीमा करीब ४०० घन मिटर र कार्यालय रहेको स्थानमा करीब १६ लाख लिटर क्षमताको पानी टंकी निर्माण गर्ने
- खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय चितवनबाट शुरु गरिएका फुलबारी, शिवनगर र पटिहानी खानेपानी आयोजनाहरुमा बोर्डको समेत लगानी गरि छिटो आयोजना सम्पन्न गर्ने र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बोर्डले लिने

- उप-महानगरपालिका, टोल सुधार संस्थाहरु र अन्य गैर सरकारी संघ संस्थाको सहयोगमा प्रदुषण रोकथाम, चुहावट नियन्त्रण, ग्राहक सचेतनाजस्ता प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरी बोर्ड र सेवाग्राहीहरु विच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्ने
- उप-महानगरपालिकासंगको सहकार्यमा फोहर पानी व्यवस्थापन, वातावरणीय सरसफाई सम्बन्धि जनचेतना मुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी फोहर घटाउन नगरपालिकालाई सहयोग गर्ने
- अत्यावश्यक स्थानहरुमा ब्यवस्थित सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने
- सरसफाई सम्बन्धि नीति नियम तर्जुमा गर्न भरतपुर उप-महानगरपालिकालाई सहयोग गर्ने

८.० कर्मचारी ब्यवस्था: आ.ब. २०७१।०७२माबोर्डको रिक्त रहेको दरबन्दी ईन्जिनियर सातौ तह र सहायक प्रशासन अधिकृत छैटौ तहमा खुला विज्ञापन गरी एक/एक जना कर्मचारी नियुक्ती गरिएको छ । सेवा प्रणालीसंगै नेपाल खानेपानी संस्थानबाट सरी आएका चार जना स्थायी कर्मचारी सहित हाल बोर्डमा ६ जना स्थायी, करारमा कार्यरत ३९ जना, डोर हाजीरीमा काम गर्ने ४ जना र नेपाल सरकारबाट काजमा आएका कार्यकारी निर्देशक १ सहित जना ५० जना कर्मचारीहरु कार्यरत छन् ।

९.० भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको आ.ब. २०७१।०७२ आम्दानी खर्चको स्थिति:

आम्दानी:

आ.ब. २०७१।७२ मा पानी महशुल वापत रकम रु. ५ करोड ६३ लाख ७६ हजार बिलिङ्ग भएको छ । अधिल्ला बर्षहरुको उठनुपर्ने रकम रु. ७४ लाख ८० हजार गरि जम्मा पाउनुपर्ने रकम रु. ६ करोड ३८ लाख ५६ हजार मध्ये यस वर्ष रु. ५ करोड ३१ लाख ५६ हजार महशुल (छुट रकम कटाएर) संकलन भई आ.ब.को अन्तमा रु. १ करोड ७ लाख बराबरको महशुल रकम उठ्न बाँकी देखिन्छ । धारा जडान शुल्क लगायत विभिन्न शिर्षकबाट रु. १ करोड ३० लाख ९६ हजार प्राप्त भएको छ । दुवै मिलाएर खुद आय रु. ६ करोड ६२ लाख ५२ हजार भएको छ । गत वर्षको बैक बाँकी रु. ९५ लाख २६ हजार समेत गरी आ.ब. २०७१।०७२को कुल आम्दानी रु. ७ करोड ५७ लाख ७८ हजार हुन आउँछ । उल्लेखित रकम आ.ब. २०७१।०७२को वार्षिक लक्षको ९१ प्रतिशत मात्र हो । पानी महशुल बाहेकका शिर्षकहरुबाट लक्षकै हाराहरीमा आम्दानी भएतापनि पानी महशुल शिर्षकमा करिब ५० लाख कम महशुल प्राप्त भएको छ । लक्ष बमोजिम महशुल संकलन नहुनुमा निम्न कारणहरु प्रमुख रुपमा देखिएको छ ।

- पानीको बढि खपत हुने अवधि पौषदेखि बैसाखको दोश्रो हप्तासम्म लगातार वर्षा हुनुका साथै जाडोकै अवस्था रहनु
- बैशाखमा गएको भुकम्पको कारण जनजीवन अस्तब्यस्त भई पानी खपत कम हुनु,
- भुकम्प पश्चात नक्सा पास स्थगित गरिएकोले नयाँ घर निर्माण कार्य रोकियो,
- धारा अनुगमन गर्नमा कठिनाई
- बढि महशुल तिर्ने ग्राहकहरु जस्तै आँखा अस्पताल, भरतपुर अस्पताल आदिले लाईन कट्टा गर्नु
- अनमिटर बिलिङ्ग हुँदै आएका सरकारी कार्यालयहरुले मिटर जडान गरे पश्चात बिलमा कमी आउनु
- भरतपुर उप-महानगरपालिकासँग साभेदारीमा निर्माण गरिएको धनगाडा खानेपानीको बोरिङ्ग लगायतका संरचना निर्माणमा केहि ढिलाई हुनु

खर्च:

यस वर्ष विभिन्न शिर्षकहरुमा तालिका नं. २ बमोजिम रु. ३ करोड २१ लाख ३० हजार संचालन खर्च भएको छ । कुल आयमा संचालन खर्च घटाउँदा रु. ३ करोड ४१ लाख २२ हजार संचालन बचत भएको छ । संचालन बचतमध्ये पूंजीगत तर्फ रु. २ करोड ७७ लाख २८ हजार खर्च भएको छ । धनगाडा खानेपानी आयोजनाको प्रथम रनिङ्ग बिल भुक्तानीको लागि भ.उ.म.न.पा. कार्यालयलाई रु. १० लाख र टि.ओ.डी मिटर खरिदको लागि कर्मचारीलाई दिईएको पेशकी रु. ४० हजार गरि जम्मा १० लाख ४० हजारको भरपाई प्राप्त भईनसकेकोले फछौट हुन बाँकी पेशकीको रुपमा रहेको छ । कुल आम्दानी रकममा उल्लेखित खर्चहरु कटाई आर्थिक वर्षको अन्तमा जम्मा रु. १ करोड ४८ लाख ७९ हजार ८८५ बैक मौज्दात रहेको छ । यो रकम गत वर्षको बैक मौज्दात भन्दा रु. ५३ लाख ५३ हजार ८४२ ले बढि हो ।

आ.ब. २०७१।०७२ को लक्षित तथा वास्तविक आम्दानी खर्चको विस्तृत विवरण निम्न अनुसार छ ।

भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, भरतपुर, चितवन

तलिका नं. २ : आ.व.२०७१/०७२ को लक्षित तथा वास्तविक आम्दानी खर्च

आम्दानी तर्फ			खर्च तर्फ				कैफियत
आम्दानी शिर्षक	लक्षित आम्दानी	वास्तविक आम्दानी रु.	खर्च शिर्षक	स्वीकृत बजेट रकम रु.	वास्तविक खर्च रु.	बाँकी बजेट रु.	
गत आ.व. को अ.ल्या.		९५२६०४२.४२	तलब	१३०००००.००	११६५१०२८.४०	१३४८९७१.६०	
पानी महशुल (खुद)	६०६७२०००.००	५३१५६४६१.१३	भत्ता	१७०००००.००	१६८६२४१.३२	१३७५८.६८	
धारा जडान शुल्क	६००००००.००	५८१५०००.००	वैठक भत्ता	१६००००.००	१३८८५२.५०	२११४७.५०	
पाईप फिटिङ्ग विक्री	४०००००.००	४७१६६०.००	दैनिक भ्रमण भत्ता	१७००००.००	१४२०५०.००	२७९५०.००	
निवेदन दस्तुर	६०००००.००	५८७२००.००	सेवा महशुल	२०००००.००	१९५६३७.००	४३६३.००	
कार्ड विक्री	७००००.००	८४५९०.००	टेलिफोन महशुल	१२००००.००	११०२२७.१८	९७७२.८२	
नामसारी ठाँउसारी	२५००००.००	१८३५२०.००	परामर्श सेवा	४०००००.००	२७५८०	१२९४२०.००	
वैक व्याज	२०००००.००	२३०५३२.४२	चन्द्रा पुरस्कार	१००००.००	१००००	०	
विविध	५००००.००	९२६३४.००	तालिम, गोप्टी, ग्राहक सचेतना तथा चुहावट नियन्त्रण कार्यक्रम	६०००००.००	२९५५२८.८८	३०४४७१.१२	
थप महशुल	१०००००.००	१२५५१०.००	ग्राहक नम्बरिङ्ग कार्यक्रम	१२००००.००	११८०३२.००	१९६८.००	
धरोटी	१५०००००.००	१४६६५००.००	वातावरणिय सरसफाई कार्यक्रम	४०००००.००	३३४०६४.२१	६५९३५.७९	
जरिवाना	२००००००.००	२२०११९५.३१	पानी सुरक्षा योजना	३०००००.००	६८६६०.८८	२३१३३९.१२	
ग्राहक नम्बर प्लेट दस्तुर	१६००००.००	१६३५००.००	अतिथि सत्कार	१२००००.००	११७४१५.६३	२५८४.३७	
खानेपानी विभाग अनुदान	८००००.००	८००००.००	ईन्धन (सवारी साधन)	३०००००.००	२९७०२५.९२	२९७४.०८	
जनसहभागिता (धनगाडा खा.पा.उ.स.वाट)	१५०००००.००	११६५०००.००	विद्युत महशुल	१२५०००००.००	११८५६५९१.९९	६४३४०८.०१	
पुरानो सामान लिलाम विक्री	३०००००.००	३६००००.००	ईन्धन अन्य (जेनेरेटर)	३००००००.००	२८२००१५.७४	१७९९८४.२६	
धरोटी निर्माण व्यवसायी		६८६५४.७४	मसलन्द कार्यालय सामान	३०००००.००	२९०७४८.९५	९२५१.०५	
			लेखा परिक्षण	६००००.००	४२०००.००	१८०००.००	
			छपाई	५२००००.००	५१७६६९.१०	२३३०.९०	
			पुस्तक तथा पत्र पत्रिका	२००००.००	१९५८५.००	४१५.००	
			औषधी खरिद	१२००००.००	११९५५४.००	४४६.००	
			विविध खर्च	८००००.००	७९३१७.००	६८३.००	
			मर्मत	३०००००.००	२९५०१४.७७	४९८५.२३	
			उपदान कोष	५०००००.००	५०००००.००	०.००	
			खानेपानी महशुल निर्धारण आयोगको सेवा शुल्क	३०००००.००	१५४२६१.८४	१४५७३८.१६	
			चालु कार्यक्रमको जम्मा	३५३०००००.००	३२१३०१०२.३१	३१६९८९७.६९	
			भरतपुर खा.पा.आ. मर्मत सुधार	३६०००००.००	३५४०६३५.०७	५९३६४.९३	
			भरतपुर खा.पा.आ.सुधार विस्तार	११००००००.००	१०८४६२१०.११	१५३७८९.८९	
			प्रेमवस्ती खा.पा.आ.	८०००००.००	६८४५९४.१५	११५४०५.८५	
			कैलाशनगर खा.पा.आ.	१००००००.००	९५९२२१.५६	४०७७८.४४	
			आनन्दपुर खा.पा. आ.	२५०००००.००	२४८६९४१.६७	१३०५८.३३	
			धनगाडा खा.पा. आ.	९००००००.००	८०६९९५५.१४	१९७००४४.८६	पेशकी खर्च समेत
			फर्निचर	१०००००.००	९२९४५.२१	७०५४.७९	
			कार्यालय उपकरण खरिद	२००००००.००	१५९०९२७.९७	४०९०७२.०३	
			भवन मर्मत तथा सेड निर्माण	५०००००.००	४९६५८१.६३	३४१८.३७	
			पूँजीगत कार्यक्रमको जम्मा	३०५०००००.००	२८७६८०१२.५१	२७७९९८७.४९	
			जम्मा खर्च रु.	६५८०००००.००	६०८९८११४.८२		
यस वर्षको जम्मा	७३८८२०००.००	६६२५१९५.६०	वैक बाँकी रु.	१७६०८०४२.४२	१४८७९८८५.२०		
कुल जम्मा	८३४०८०४२.४२	७५७७८०००.०२	कुल जम्मा रु.	८३४०८०४२.४२	७५७७८०००.०२		

१०. आ. व. २०७१/०७२ मा बोर्डबाट गरिएका मुख्य कार्यहरु:

भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले आ.व.२०७१/०७२मा नियमित खानेपानी सेवा संचालनका अतिरिक्त आन्तरिक श्रोत र अन्य निकायको सहयोगबाट निम्न उपलब्धिहरु हासिल गरेको छ ।

१०.१ भरतपुर खानेपानी आयोजना सुधार विस्तार:

आ.व. २०७१/०७२मा आपटारी र मालपोत चोकमा गरी २ सेट डिप ट्युबवेल (DTH Method) निर्माण गरिएको छ । विभिन्न स्टेसनमा ४ वटा नयाँ सबमर्सिबल पम्पसेटहरु र शरदपुर पम्प स्टेसनमा ८२.५ के.भि.ए.को जेनरेटर १ सेट जडान भएको छ । यस वर्ष १३.५ कि.मि. वितरण पाईपलाईन थप गरिएको छ । पाईपलाईन थप गरिएका स्थानहरु यस प्रकार छन् ।

वितरण प्रणाली थप भएका मुख्य स्थानहरु :

वडा नं.	स्थान	परिमाण
वडा नं. २	देउती टोल, भानु मार्ग, सानो गुम्बा अगाडी	३५० मिटर
वडा नं. ३	भृकुटी पथ (नारायणगढ)	२९० मिटर
वडा नं. ४	देवी चोक, संसारी माई टोल विकास संस्था, कमल नगर	४९० मिटर
वडा नं. ५	अद्वैत चोक देखी विशाल चोक सम्म र विशाल चोक टोल	५६० मिटर
वडा नं. ६	नव दुर्गा टोल, अनुपम टोल विकास संस्था	८२५ मिटर
वडा नं. ७	मनकामना टोल विकास संस्था र नमुना टोल	३५० मिटर
वडा नं. ८	हिमालय फिडनेर र जानकी टोल विकास संस्था (पारसनगर)	२९८० मिटर
वडा नं. ९	विशाल टोल सुधार समिती, मिलन चोक टोल, त्रिपुरेश्वर टोल सुधार समिति	५५८ मिटर
वडा नं. १०	मालपोत चोक बाट भरतपुर स्कूल सम्म, एयरपोर्ट टोल, युनिक गुप टोल, ज्ञान दर्शन टोल, सि.एम.सि. हस्पिटल अगाडी	१४९२ मिटर
वडा नं. ११	ज्ञान दर्शन टोल सुधार समिती, सिद्धिविनायक टोल विकास संस्था, मनकामना टोल विकास संस्था, दिपज्योती टोल, वसेनि बजार चोक टोल, त्रिवेणी एफ.एम. पछाडी	३०८० मिटर
वडा नं. १२	भि.आइ.पि.कोलोनी पछाडी र जागृती चोक नजिक	२८५ मिटर
वडा नं. १३,१४	तोरीखेत र सृष्टि टोल विकास संस्था	३०५० मिटर
जम्मा		१३,५१० मिटर

१०.२ भरतपुर खानेपानी आयोजना मर्मत सुधार:

आ.व. २०७१/०७२ मा भएका मुख्य मुख्य मर्मत सुधार कार्यहरु यस प्रकार छन् ।

- ३२५ वटा Major Leakage र ४४९ वटा Minor Leakage मर्मत
- नयाँ मिटर जडान तथा मर्मत सेवा १३९४, होलचेन्ज २७, अस्थायी प्लग खोले ४ र धाराको लागत कट्टा गर्ने कार्य १८, यसबाट सेवा शुल्क वापत रु. २,६४,२२५/- प्राप्त भएको
- भरतपुर कार्यालय हाताभित्रको १२०० घनमीटरको पानीटंकीको रङ्गरोगन गरिएको
- वुस्टर पम्प मर्मत तथा रिवाईण्डिङ् कार्य ५ पटक र १ वटा सबमर्सिबल पम्प रिवाईण्डिङ् गरिएको
- ओभरलोडको कारण कृष्णपुर कार्यालयको ट्रान्सफर्मर देखी टि.ओ.डी मिटर सम्मको आल्मुनियम पावर केवल जलेकोले परिवर्तन गरिएको ।

- भरतपुर कार्यालय स्थित १०० के.भि.ए.को ट्रान्सफर्मर मर्मत गरिएको ।
- विभिन्न स्थानमा रहेका जेनेरेटरहरु १२ पटक सर्भिसिङ्ग गरिएको ।
- ३ वटा TOD मिटर विग्रेकोले नयाँ मिटर जडान गरिएको
- कृष्णपुरको 11 KV Electric Lineले व्यक्तिको घरलाई असर गरेकोले त्यसको सुधार गरिएको ।
- आकस्मिक रुपमा सडक तथा नाला निर्माणको क्रममा विग्रेको पाईप लाईन मर्मत गरिएको

१०.३ धनगाडा खानेपानी आयोजना:

- आयोजना संचालनको लागि बोर्डको ७५% र उपभोक्ताको २५% लगानी हुने गरि ३ कट्टा जग्गा खरिद भएको
- भरतपुर उप-महानगरपालिकाको जगेडा कोष कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकाकोको ७०% र बोर्डको ३०% लगानीमा डिप ट्युबवेल-१, ११ के.भि.ए. विद्युत लाईन, ५० के.भि.ए.को ट्रान्सफर्मर-१ तथा ६ कि.मि. वितरण पाईपलाईन निर्माण भएको, बोर्डको लगानीमा पम्प घर १ निर्माण भएको
- लुमन्ति संस्थाबाट सहरी गरीवहरुको लागि संचालित शुशासन परियोजनाबाट वार्ड नम्बर ११ र १२को विषेश गरि जंगल किनारातर्फका बस्तीमा ७.० कि.मि. वितरण पाईपलाईन निर्माण गरि वार्ड नम्बर ११को नयाँ किरण मा.वि.नेरबाट पुरानो नेटवर्कमा जोडेर करीव १०० घरधुरीलाई सेवा दिईसकिएको, पम्प जडान पश्चात सबै लाईनमा पानी संचालन हुने
- बाँकी संरचना निर्माणको लागि खानेपानी तथा ढल निकास विभागको सह-लगानी कार्यक्रममा समावेश गर्ने उद्देश्यले खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयबाट लागत ईष्टमेट परिमार्जन गरिएको
- यस आयोजनाको वार्ड नम्बर ९को कोकाकोला कम्पनी वरपर ६ कि.मि. वितरण लाईन निर्माणको लागि बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडलाई अनुरोध भई केहि सहयोग गर्ने आश्वासन प्राप्त भएकोमा हालसम्म सहयोग उपलब्ध हुन सकेको छैन, चालु बर्षमा केहि सहयोग गर्ने मौखिक जानकारी प्राप्त भएको

१०.३ प्रेमवस्ती कालीका खानेपानी आयोजना:

- यस बर्ष २.५ कि.मि. पाईपलाईन विस्तार गरिएको
- खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयबाट ४५० घ.मी. पानी टंकी निर्माण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको

१०.४ कैलाशनगर खानेपानी आयोजना :

- यस बर्ष ४.० कि.मि. पाईपलाईन विस्तार गरिएको
- डिप ट्युबवेलको दायँबायाँबाट पानी प्रदुषित हुन नदिन आर.सि.सि. प्लेटफर्म निर्माण गरिएको

१०.५ आनन्दपुर खानेपानी आयोजना :

- यस बर्ष ७.० कि.मि पाईपलाईन विस्तार गरिएको
- आषाढ मसान्तसम्म १३० जना थप ग्राहकले निजि धारा जडान गरि सकेका

१०.६ कार्यालय भवन मर्मत तथा सेड निर्माण

- भरतपुर कार्यालय भवनको पछाडि २ कोठे चौकीदार घर निर्माण गरिएको
- शरदपुर स्थित पम्पघरमा जेनेरेटर घर तथा सेड निर्माण गरिएको

१०.७ वातावरणीय सरसफाई कार्यक्रम:

- नारायणगढ बजारको नारायणी पुल नजिक शसस्त्र प्रहरी वल र सर्वसाधारणहरुको प्रयोगको लागि २ कोठे, भित्री भागमा स्टेनलेश स्टिल लाईनिङ्ग गरिएको शौचालय निर्माण गरी त्यसको संरक्षण र व्यवस्थापन स्थानीय उपभोक्ता समितिले गर्ने गरी जिम्मा लगाईएको, गत बर्ष निर्माण गरिएको आँपटारीस्थित शौचालयको बाँकी रकम भुक्तानी गरिएको
- भरतपुर उप-महानगरपालिका वडा नं. १०, ११, १२का ३० जना सामाजिक अगुवाहरुको लागि गैर सरकारी संस्था राष्ट्रिय विकास सेवा मार्फत खानेपानी तथा वातावरणीय सरसफाई सम्बन्धी १ दिने अभिमुखीकरण गोष्ठी सम्पन्न गरिएको
- जैविक फोहर घरमै व्यवस्थापनको लागि भरतपुर उप-महानगरपालिकाको विभिन्न टोलमा बोर्डबाट कम्पोष्ट च्याम्बरको प्रवर्द्धनको लागि ५० प्रतिशत रकम अनुदान दिई ४० घरमा कम्पोष्ट च्याम्बर निर्माण गरिएको

तालिका नं.: कम्पोष्ट च्याम्बर वितरण गरिएका टोलहरु:

वडा नं.	टोलको नाम	संख्या (सेट)
वडा नं. ७	उज्वल टोल विकास संस्था	२० सेट
वडा नं. ७	शिव टोल विकास संस्था	१३ सेट
वार्ड नं १०,११	विभिन्न	७ सेट
		जम्मा ४० सेट

१०.८ तालिम, गोष्ठी, ग्राहक सचेतना तथा चुहावट नियन्त्रण कार्यक्रम: कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि र सेवाग्राहीहरुसंग सुमधुर सम्बन्ध स्थापना गर्ने उद्देश्यले यस कार्यक्रम अन्तर्गत आ.ब.२०७१।०७२मा निम्न कार्यहरु सम्पन्न गरिएको छ।

- बोर्डका ४० जना कर्मचारीहरुको लागि तनाव व्यवस्थापन सम्बन्धी १ दिने तालिम संचालन गरिएको
- सेवाक्षेत्र भित्रका विभिन्न उपभोक्ता विभिन्न समितिहरु, बोर्ड र खानेपानी तथा ढल निकास विभाग विचको सम्बन्धलाई कसरी व्यवस्थित र संस्थागत गर्ने भन्ने विषयमा राय सुझाव संकलन गरि सहरी विकास मंत्रालयमा पठाउने उद्देश्यले बोर्ड अन्तर्गतका खानेपानी उपभोक्ता समितिका २५ जना पदाधिकारीहरुलाई सहभागि गराई अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको
- बोर्डका ३ जना प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई ट्रेनिङ सेन्टर नेपाल मार्फत आधारभुत स्तरको ईलेक्ट्रो-मेकानिकल उपकरण मर्मत संभार सम्बन्धि तालिम दिईएको
- भरतपुर वडा नं. १०, ११, १२ का २५ जना सामाजिक अगुवाहरुको लागि गैर सरकारी संस्था राष्ट्रिय विकास सेवाको सहयोगमा खानेपानी तथा वातावरणीय सरसफाई सम्बन्धी १ दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको
- बोर्डको आम्दानी खर्च, वार्षिक कार्यक्रम तथा सेवाशुल्कहरु लगायतका सूचनाहरु सेवाग्राही सम्म पुऱ्याउन विभिन्न पत्रपत्रिका, एफ.एम., टेलिभिजन, फ्लेक्स प्रिन्ट आदिबाट प्रवाह गरिएको

१०.९ खानेपानी सुरक्षा योजना (Water Safety Plan):

- ✓ क्षेत्रिय पानी परीक्षण प्रयोगशालाबाट सबै वेलहरुको पानीको गुणस्तर सम्बन्धी प्यारामिटरहरु धमीलोपना, पि.एच., कोलीफर्म ब्याक्टेरीया आदी परीक्षण गरिएको
- ✓ सतह ढलमा पानी ब्लक भई पाइएको पानी प्रदुषण हुनसक्ने जोखिमयुक्त स्थानहरु (हाकिम चोक, बाईपास सडक आदी) मा भरतपुर उप-महानगरपालिकालाई अनुरोध गरि नाला सफाई गरिएको
- ✓ गुणस्तर अनुगकनको लागि ३० जना ग्राहकहरु (Randomly Selected)को धाराबाट मासिक १ वटाका दरले पानीको नमुना संकलन गरि गुणस्तर (धमीलोपना, पि.एच., रेजिड्युवल क्लोरिन, कोलीफर्म ब्याक्टेरीया) परीक्षण गरिएको, परीक्षणको नतिजा बोर्डको वेबसाईट www.bwsmb.org.np मा राखिएको

११. आगामी बर्ष प्राथमिकता दिनुपर्ने कार्यहरु:

- यस बर्ष मालपोत चोक र आँपटारीमा थप वेलहरु निर्माण गरि चालु गरिएको र शरदपुरमा जेनरेटर जडान गरिएकोले सुख्खा समयमा पानी सप्लाईमा खासै समस्या देखिएन । विद्युत आपूर्तिमा गडबढी र स्थानीय उपभोक्ताहरुले आँफुखुसी भल्भ चलाईदिंदा पोखरा बसपार्क क्षेत्रमा कहिलेकाहिं समस्या देखियो । माथिल्लो आँपटारी, तल्लो आँपटारी र पोखरा बसपार्कलाई आलोपालो गरि पानी सप्लाई गनुपर्ने समस्याको स्थायी समाधानको लागि आँपटारीमा करीव ४ लाख लिटर क्षमताको पानी टंकी निर्माण गर्नु अत्यावश्यक भईसकेको छ । यसको लागि भरतपुर उप-महानगरपालिका, स्थानीय उपभोक्ता समुदाय, र सांसद विकास कोषबाट समेत केहि बजेट व्यवस्थाको लागि अनुरोध गर्न सकिन्छ ।
- आ.ब. २०७१।०७२ मा शुरु गरिएको धनगाडा खानेपानी आयोजना खानेपानी तथा ढल निकास विभाग अन्तर्गतको सह-लगानी आयोजनामा समावेश भई आ.ब. २०७२।०७३ मा रु. १६ लाख विनियोजन भएको छ । यस आयोजनामा निर्माण गर्न बाँकी रहेका सम्पूर्ण संरचनाहरुको एकमुष्ट टेण्डर हुने भएकोले बोर्डको तर्फबाट ब्यहोर्ने रकममध्ये आ.ब. २०७२।०७३ मा केहि थप बजेट व्यवस्था गरि निर्माण कार्य अघि बढाउन सकिएमा चालु आ.ब.मा करीव १००० धारा थप गर्न सकिन्छ ।

- भरतपुर प्रणाली, प्रेमवस्ती, तोरिखेत, गौरिगंज र आनन्दपुर गरि नियमित रूपमा करीव ३० कि.मि. वितरण लाईन विस्तारको माग आउने भएकोले यसको लागि बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रेमवस्तीको टंकी सम्पन्न हुने भएकोले सितारामचोकदेखि लाईन विस्तार गरि चोक बजारसम्म पुऱ्याउन सकिएमा ग्राहकको संख्यामा उल्लेखनिय वृद्धि हुन्छ।
- पटिहानीमा खानेपानी आयोजना संचालन गर्न माग भई आएको र त्यसको लागि स्थानीय तहबाट जग्गा उपलब्ध गराउने आशवासन प्राप्त भएको छ। यस वर्ष खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयबाट पटिहानी खानेपानी आयोजनाको लागि रु. २ लाख विनियोजन भई विस्तृत सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न हुने भएकोले शुरुदेखिनै डिभिजन कार्यालय, बोर्ड र उपभोक्ताको सहकार्य गरि यस आयोजनालाई बोर्डको व्यवस्थापनभित्र ल्याउने गरि आयोजना निर्माण गर्न उपयुक्त देखिन्छ। यसको लागि उपभोक्ता समितिले जग्गाको व्यवस्थापन गरेमा बोर्डबाट १ सेट डिप बोरिङ्ग गर्नु आवश्यक छ।
- भरतपुर उप-महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको बलेरो गाडी ज्यादै पुरानो भएको हुँदा बोर्डलाई कार्यकारी निर्देशकको प्रयोग र आकस्मिक समयमा पम्प मोटर लगायतका उपकरणहरू ढुवानी गर्न मिल्ने खालको पिक अप गाडि खरिद गर्नु आवश्यक छ।

१२. भरतपुर खानेपानी प्रणालीका प्रमुख सूचकहरू (KeyPerformance Indicators):

१२.१ औसत खपत अंक:

आ.व. २०७१/०७२को प्रति ग्राहक प्रति महिना औसत खपत अंक मिटर रिडिङ्गको आधारमा १८ युनिट र बिलिङ्गको आधारमा २० युनिट छ। जबकी गत वर्ष यो अंक क्रमशः १८ र २२ थियो। आ.व. २०७१/०७२ को चुहावट दर ३० प्रतिशत रहेको छ। पौषदेखि वैशाखसम्म भएको लगातारको वर्षाको कारण पानी खपतमा आएको कमी, अनमिटर धाराको संख्यामा कमी, नयाँ विस्तार भएका अधिकांस स्थानहरूमा न्युनतम अंक बराबर मात्र खपत हुनु, बढि खपतकर्ता ग्राहकहरूले लाइन कट्टा गरेको आदी कारणहरूबाट यस वर्षको औसत खपत अंक गत वर्षभन्दा कम देखिएको छ।

१२.२ औसत बिलिङ्ग रकम: यस वर्ष प्रति ग्राहक प्रति महिना औसत बिलिङ्ग रकम रु. ३१६.०० हुने अनुमान गरि महशुल अनुमान गरिएकोमा मथि उल्लेखित कारणहरूले गर्दा यस आ.व.मा प्रति ग्राहक प्रति महिना औसत बिलिङ्ग रु. २८०।- रहेको छ।

१२.३ महशुल असुली तथा बक्यौताको स्थिति:

वि.सं. २०७२ साल आषाढ मसान्तमा विभिन्न ग्राहकहरूबाट रु. १ करोड ७ लाख पानी महशुलको रकम उठ्न बाकी रहेको छ। यो रकममध्ये करीव रु. २०,००,०००।- अघिल्ला वर्षहरूको बक्यौता रकम हो। अघिल्ला वर्षहरूको बक्यौता रकममध्ये करीव रु. १० लाख घर ठेगाना फेला पर्न नसकेका, घर जग्गा बेचेर अन्यत्र गएका, धारा फेला पर्न नसकेका र कार्यालय नै बन्द भईसकेका सरकारी कार्यालयहरू, ग्राहको नम्बर डबल परि बक्यौता देखिन गएको, लागत कट्टा भई सकेका ग्राहकको पनि न्युनतम बिलिङ्ग भईरहेको आदी कारणहरूले बक्यौताको रूपमा रही आएको छ। यस प्रकृतिको बक्यौता बोर्डबाट निर्णय गरि लागतबाट हटाउन मनासिब देखिन्छ।

विशेष गरी वडा नं.१, २, ३, ४ र १०का पुराना ग्राहकहरूबाट बढि मात्रामा महशुल उठन बाँकी छ। यस आर्थिक वर्षको अन्तमा करीव २ महिनाको बिल बराबरको रकम उठ्न बाँकि देखिएको छ। यसबाट महशुल असुलीमा सुधार भएको देखिन्छ। विभिन्न विवरणहरूको आधारमा यस प्रणालीका प्रमुख सूचकहरू (KeyPerformance Indicators) तयार गरिएको छ। उक्त सूचकहरूको सारांश यस प्रकार छ।

तलिका नं. ४: भरतपुर खानेपानी प्रणालीका प्रमुख सूचकहरू (Key Performance Indicators)

विवरण	२०६९/१०७० को औसत	२०७०/१०७१ को औसत	२०७१/१०७२ को औसत	कैफियत
औषत ग्राहक संख्या (१/२")	१३८५०	१४८५०	१६७१५	
सेवा पुगेको जनसंख्या	८५८७०	९२०७०	१०५०००	
सेवा पुगेको जनसंख्या, प्रतिशत	५५	५८	४५	५ गा.वि.स. थप भएको
दैनिक सरदर पानी उत्पादन, लिटर	१३००००००	१५२०००००	१६००००००	
दैनिक सरदर पानी विक्री, लिटर	८४५००००	११२०३०००	११२०००००	
मिटर भएको धाराको प्रतिशत	९६	९८	९९	
चुहावट, प्रतिशत	३५	३०	३०	
पानी सप्लाई समय, घण्टा	९	९	१०	
पानी नचल्ने धाराहरूको प्रतिशत	नगन्य	नगन्य	छैन	
प्रति व्यक्ति उत्पादन/विक्री, लिटर	१५४/१००	१७०/१२५	१६०/१११	
प्रति युनिट इन्धन दर रु. (जेनरेटर सहित)	६.९५	६.९०	७.४४	
प्रति ग्राहक औषत खपत(रिडिङ अनुसार/विल अनुसार)	१४/१८	१८/२२	१८/२०	
प्रति युनिट पानी सप्लाईमा लाग्ने खर्चहरू				
ईन्धन खर्च, रु.	३.६१	३.४६	३.६८	
कर्मचारी खर्च रु.	२.४६	२.६७	३.२७	
प्रशासनिक खर्च	०.९२	०.८५	०.७१	
मर्मत संभार, खर्च रु.	१.०५	०.९८	०.९४	
नियमित सुधार विस्तारमा लगानी, रु.	३.८०	३.५७	५.९४	
जम्मा प्रत्यक्ष खर्च, रु.	११.८४	११.५३	१४.५४	
अप्रत्यक्ष खर्च (उपदान, सापटी र हासकट्टी) रु.	५.४६	४.२१	३.२६	
ऋणको साँवा ब्याज, रु.	३.३५	२.८९	२.२६	
जम्मा खर्च (प्रति युनिट) रु.	२०.६५	१८.६३	२०.०६	
प्रति युनिट आम्दामी, रु.				
पानी महशुल, रु.	९.५०	११	१३.०७	
अन्य आम्दामी, रु.	३.०५	२.७५	२.८४	
जम्मा आम्दामी (प्रति युनिट) रु.	१२.५५	१३.७५	१५.९१	
प्रति युनिट घाटा रु.	८.१०	४.८८	४.१५	
संचालन खर्चहरू (प्रति ग्राहक प्रति महिना)				
ईन्धन खर्च, रु.	६१.१७	७८	७४.६५	
कर्मचारी खर्च रु.	५२.९१	६१	६६.४९	
प्रशासनिक खर्च, रु.	१३.३६	१९	१३.४८	
मर्मत संभार, केमिकल र अन्य खर्च रु.	१३.०४	२२	१९.७१	
जम्मा संचालन खर्च, रु.	१४०	१८०	१७४.३३	
ओभरहेड खर्चहरू (प्रति ग्राहक प्रति महिना)				
कर्मचारी विदा तथा उपदान खर्च, रु.	४.८७	७	२.८५	
वितरण लाईन तथा उत्पादन क्षमता विस्तारमा लगानी, रु.	८३.००	८१	१२०.५८	
सापटी फिता, ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी, रु.	२४.०७	४०		
हासकट्टी खर्च, रु.	७५.२१	७३	६३.६८	
खानेपानी महशुल निर्धारण आयोगको सेवाशुल्क, रु.		१	१	
जम्मा ओभरहेड खर्च रु.	१८७	२०२	१८८.११	
कुल जम्मा खर्च (प्रति ग्राहक प्रति महिना) रु.	३२८	३८२	३६२.४४	
कर्मचारी संख्या (प्रति हजार ग्राहक)	३.०६	३.०३	३.०५	
औषत आम्दामी (प्रति ग्राहक प्रति महिना) रु.				
महशुल आम्दामी, रु.	१७०	२२९	२६५	
अन्य आम्दामी, रु.	५८	६१	५७.६०	
जम्मा आम्दामी, रु.	२२८	२९०	३२२.६१	
प्रति ग्राहक घाटा, रु.	-१००	-९२	-३९.८३	
संकलन अर्वाधि, दिन	८०	६०	६०	

महशुल निर्धारण आयोग बाट २०७० फाल्गुन १ गते बाट लागु हुने गरी निर्धारण गरिएको भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको नयाँ महशुल दर

पाईप साइज	धारा किसिम	मिटर भएका धारा		
		न्यूनतम खपत लिटर	न्यूनतम महशुल दर रु. कायम गरिएको	बढी खपत महशुल दर रु. (प्रति हजार लिटर) कायम गरिएको
१/२"	निजि/घरायसी	१००००	१००	१८
१/२"	संस्थागत	१००००	१३५	२०
३/४"	निजि,संस्थागत	२७०००	९७५	३०
१"	निजि,संस्थागत	५६०००	२०२०	३०
पाईप साइज	धारा किसिम	मिटर नभएको धाराहरु		थप शाखा धाराहरु
१/२"	निजि/घरायसी	२४०००	८१०	३००
१/२"	संस्थागत	२४०००	१०८०	५००
३/४"	निजि,संस्थागत	६५०००	२७००	२०००
१"	निजि,संस्थागत	१३५०००	५४००	३३००

अन्य सेवाशुल्कहरु

क्र. सं.	विवरण/आय शिर्षक	कायम गरिएको दर रु.
		१/२ "
१	निवेदनशुल्क	२००.००
२	धारा जडानशुल्क (क)	४०००.००
३	धरौटी	१०००.००
४	नामसारी शुल्क, अंशवण्डा बाट प्राप्त गर्दा	५००.००
५	नामसारी शुल्क, अन्य तरिकाबाट प्राप्त गर्दा	१०००.००
६	ठाउँसारी	२७००.००
७	होलचेन्ज दस्तुर	५००.००
८	१/२" जि.आई. पाईप	परल मोल
९	मिटर बिक्री, १/२"(ख)	परल मोलमा १०% सेवा शुल्क लिई बिक्री तथा जडान गरिने
१०	फेरुल बिक्री, १/२"(ग)	परल मोलमा १०% सेवा शुल्क लिई बिक्री गरिने
११	ग्राहक कार्ड बिक्री	१०.००
१२	ग्राहक नम्बर प्लेट दस्तुर	१००.००

(क) समूहगत धारा तथा नेपाल सरकारको अधिकारिक निकायबाट विपन्न परिवार भनि परिभाषित भएको व्यक्तिलाई

१/२" धारा जडान शुल्क र धरौटी रकमा ५०% छुट दिईनेछ ।

(ख) १/२ " भन्दा ठूलो धाराको हकमा जडान खर्च, धरौटी, नामसारी, ठाँउसारी र होलचेन्ज शुल्क लिँदा १/२ " धाराको दररेटमा ३/४ " र १" को लागि क्रमशः २.२५ र ४.०० ले गुणा गरि लिईनेछ ।

(ग) ग्राहकले गुणस्तरीय मिटर बजारबाट समेत खरिद गर्नसक्ने ।

(घ) ग्राहकले गुणस्तरीय फेरुल बजारबाट समेत खरिद गर्नसक्ने ।



तेश्रो चौमासिक र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.व. :- २०७१/०७२
२. संस्था :- भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड
३. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :- भरतपुर खा.पा.आ. सु.वि.
४. स्थान :- (क) जिल्ला :- चितवन
५. (ग) उ.म.न.पा. :- भरतपुर वार्ड नः विभिन्न
६. आयोजना शुरू भएको मिति :- सालबसाली
७. आयोजना पुरा हुने मिति :- सालबसाली

- १० वार्षिक बजेट (रु.) ११०००
- (१) भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड
- (२) भरतपुर उपमहानगरपालिका
- (३) जनसहभागिता :-

- (रकम रु. हजारमा)
११. आयोजनाको कूल लागत (रु.) : शुरूको ११०००
- लागत अनुमान स्विकृत मिति:
- (१) भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड :- ११०००
- (२) भरतपुर उपमहानगरपालिका :-
- (३) जनसहभागिता :-

जम्मा स्किम संख्या :- आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने थप रकम:-

१२. गत आ.व. सम्मको खर्च रु. १०८४६
- (१) भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड :-
- (२) भरतपुर नगरपालिका :-
- (३) जनसहभागिता :-

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	आयोजनाको कूल क्रियापलापको			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गत आ.व. सम्मको			वार्षिक कार्य लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक				प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्मको		खर्च रु. हजारमा	कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित प्रगति	परिमाण	भार	बजेट	कार्य लक्ष्य		प्रगति		परिमाण	भारित प्रगति	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति		
												परिमाण	भार	परिमाण	भारित						
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२१
१	पाईप, फिटिंग्स उपलब्धी	कि.मी.	१६.०	३५००	३१.८२				१६.०	३१.८२	३५००	९.००	१७.९०	९.००	१७.९०	१६.०	३१.८२	१६.०	३१.८२	३६५२	
२	वितरण पाइपलाइन जडान	कि.मी.	१६.०	२९००	२६.३६				१६.०	२६.३६	२९००	९.००	१४.८३	९.००	१४.८३	१६.०	२६.३६	१६.०	२६.३६	२६००	
३	डिप ट्युवेल तथा अन्य निर्माण कार्य	प्र.श.	२	४१००	३७.२७				२	३७.२७	४१००	१.००	१८.६४	१.००	१८.६४	२.०	३७.२७	२.०	३७.२७	४२६७	
४	अन्य निर्माण कार्य	प्र.श.	१००	३००	२.७३				१००	२.७३	३००	५०.००	१.३६	५०.००	१.३६	१००.०	२.७३	१००.०	२.७३	१६०	
५	कन्टिन्जेन्सीज (सानातिना अन्य खर्च)	प्र.श.	१००	२००	१.८२				१००	१.८२	२००	५०.००	०.९१	५०	०.९१	१००.०	१.८२	१००.०	१.८२	१६७	
	कूल जम्मा			११०००	१००					१००.००	११०००		५३.६४		५३.६४	१००.००		१००.००		१०८४६	

तेश्रो चौमासिक प्रगति १०० %
वार्षिक प्रगति १०० %

हरिष्ट लेखा सहायक

तयार गर्ने

कार्यकारी वि.स.स.स.

प्रमाणित गर्ने

तेश्रो चौमासिक र वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन



१. आ.व. :- २०७१/७२

२. संस्था :- भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड

३. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :- भरतपुर खा.पा. आ. मर्मत तथा सुधार

४. स्थान :- (क) जिल्ला :- चितवन

५. (ग) उ.म.न.पा. : भरतपुर

६. आयोजना शुरू भएको मिति :-सालवसाली

७. आयोजना पुरा हुने मिति :-सालवसाली

१०. वार्षिक बजेट (रू.)

(१) भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड :-

(२) भरतपुर नगरपालिका :-

(३) जनसहभागिता :-

(रकम रू. हजारमा)

११. आयोजनाको कूल लागत (रू.) : शुरूको -

३६००

३६००

(१) भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड :-

३५५७

(२) भरतपुर उपमहानगरपालिका :-

(३) जनसहभागिता :-

(३) गै.स.स. :-

आयोजनाबाट लाभान्वित हुने कूल जनसंख्या :-

जम्मा रिकम संख्या :-

आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने थप रकम:-

क्र.सं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाइ	आयोजनाको कूल क्रियापलापको			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गत आ.व. सम्मको			वार्षिक कार्य लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक				प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्मको		खर्च रू. हजारमा	कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित प्रगति	परिमाण	भार	बजेट	कार्य लक्ष्य		प्रगति		परिमाण	भार	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति		
												परिमाण	भार	परिमाण	भार						
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२१
१	इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण मर्मत सुधार	प्र.श.	१००	१५००	४१.६७				१००	४१.६७	१५००	४०	१६.६७	४०	१६.६७	१००	४१.६७	१००	४१.६७	१२६२	
२	वितरण प्रणाली मर्मत सुधार (आवस्यक पाइप, फिटिंग्स उपलब्धी सहित)	प्र.श.	१००	१९००	५२.७८				१००	५२.७८	१९००	४०	२१.११	४०	२१.११	१००	५२.७८	१००	५२.७८	२००३	
४	अन्य निर्माण कार्यहरू	प्र.श.	१००	१००	२.७८				१००	२.७८	१००	५५	१.५३	५५	१.५३	१००	२.७८	१००	२.७८	२०७	
५	कन्टिन्जेन्सीज (सानातिना अन्य खर्च)	प्र.श.	१००	१००	२.७८				१००	२.७८	१००	६०	१.६७	६०	१.६७	१००	२.७८	१००	२.७८	८५	
	कूल जम्मा			३६००	१००.००				४००	१००.००	३६००		४०.९७		४०.९७		१००.००	४००	१००.००	३५५७	

तेश्रो चौमासिक प्रगति १०० %

वार्षिक प्रगति १०० %

वरिष्ठ लेखा सहायक

कार्यकारी निर्देशक

तेश्रो चौमासिक र वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन



१. आ.व. :- २०७१/०७२
 २. संस्था :- भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड
 ३. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :- कैलाशनगर खानेपानी आयोजना
 ४. स्थान :- (क) जिल्ला :- चितवन
 (ग) उ.म.न.पा. : भरतपुर वार्ड नं. १३, १४
 ५. आयोजना शुरू भएको मिति :- २०६८/०६९
 ६. आयोजना पुरा हुने मिति :- २०७२/७३

१०. वार्षिक बजेट (रु.) :- १०००
 (१) भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड :- १०००
 (२) भरतपुर नगरपालिका :-
 (३) जनसहभागिता :-

(रकम रु. हजारमा)
 ११. आयोजनाको कूल लागत (रु.) : शुरूको ४६१५४
 लागत अनुमान स्विकृत मिति:
 (१) भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड :-
 (२) भरतपुर नगरपालिका :-
 (३) जनसहभागिता :-

आयोजनाबाट लाभान्वित हुने कूल जनसंख्या :- १०३७६ जम्मा स्किम संख्या :- १ आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने थप रकम:-

१२. यस आ.व. को खर्च रु. २१०९
 (१) भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड :- ९५९
 (२) भरतपुर नगरपालिका :- ३८०
 (३) जनसहभागिता :- ४५०

क्र.सं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	आयोजनाको कूल			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गत			वार्षिक कार्य लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक				प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्मको		खर्च रु. हजारमा	कैफियत	
			क्रियापलापको			आ.व. सम्मको			परिमाण	भार	बजेट	कार्य लक्ष्य		प्रगति		परिमाण	भार	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति			
			परिमाण	लागत	भार	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित प्रगति				परिमाण	भार	परिमाण	भार							
१	विस्तृत डिजाइन तथा ल.इ.तयारी	प्र.श.	१००	७०	०.१५	१००	१००	०.१५									१००	२०	२१	२१	BNP	
२	आयोजना मूल्याङ्कन/सम्झौता	प्र.श.	१००	२०	०.०४	५०	०.०२										५०	०.०२				
३	जग्गा उपलब्धी	कटठा	२	३०००	६.५०	२	३०००	६.५०									२	६.५०	३०००		User	
४	आयोजना निर्माण सम्बन्धि तालिमहरू	प्र.श.	१००	१००	०.२२																	
५	डिप टयुबेल निर्माण	गोटा	१	२१२०	४.५९	१	१३००	४.५९									१	४.५९	१३००		BNP	
६	इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण उपलब्धी जडान	प्र.श.	१००	२६५४	५.७५	१००	१४६५	५.७५									१००	५.७५	१४६५		BNP	
७	पाईप, फिटिंग्स तथा औजार उपलब्धी	कि.मी.	२७	१३७५०	२७.७९	११	२८७६	१२.१४	४	४.४१	३५०	३.००	३.३१	३.००	३.३१	४.००	४.४१	१५	१६.५५	३४६५		BWSMB
							२००				(३८०)									५८०	BNP	
८	ओभरहेड पानी टंकी निर्माण	गोटा	१	९०४०	१९.५९																	
९	वितरण पाइपलाइन जडान	कि.मी.	२०	५३००	११.४८	११	१७२२	६.३२	४	२.३०	४५०	३.००	१.७२	३.००	१.७२	४.००	२.३०	१५	८.६१	१९३९		BWSMB
							५००													५००	BNP	
१०	निजि धारा जडान	गोटा	५००	५०००	१०.८३	१००	१४००	२.१७	५०	१.०८	(४५०)	३०.००	०.६५	३०	०.६५	५०	१.०८	१५०	३.२५	१८५०		User
११	अन्य निर्माण कार्यहरू (वि.पी.टी, भल्व च्याम्बर, कुसिङ्ग, पम्पहाउस, क्रम्पाउन्ड बाल)	प्र.श.	१००	२२००	४.७७	३०	४७०	१.४३	१०	०.४८	१५०	५	०.२४	५.००	०.२४	१०.००	०.४८	४०	१.९१	६१०		BWSMB
१२	कन्टिन्जेन्सीज	प्र.श.	१००	१०००	२.१७	१०	६२	०.२२	१०	०.२२	५०	५.००	०.११	५.००	०.११	१०.००	०.२२	२०	०.४३	७५		
१३	मूल्य समायोजन कन्टिन्जेन्सीज	प्र.श.	१००	१९००	४.१२																	
	जम्मा			४६१५४	१००.००		१३०९५	३९.२८		८.४९	१०००		६.०३		६.०३	८.४९		४७.७७	१४८८४			

तेश्रो चौमासिक प्रगति १०० %

वार्षिक प्रगति १०० %

तयार गर्ने:

(Signature)
 बरिष्ठ लेखा सहायक

प्रमाणित गर्ने:

(Signature)
 कार्यकारी निर्देशक



तेश्रो चौमासिक र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. बा.व. :- २०७१/७२
 २. संस्था :- भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड
 ३. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :- धनपाडा खा.पा. आ.
 ४. स्थान :- (क) जिल्ला :- चितवन
 (ग) उ.म.न.पा. :- भरतपुर
 ५. आयोजना शुरू भएको मिति :- २०७१/०७२
 ६. आयोजना पूरा हुने मिति :- २०७४/०७५
 आयोजनाबाट लाभान्वित हुने कूल जनसंख्या :- २५००

१०. वार्षिक बजेट (रु.) :- १०००
 (१) भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड :- ९०००
 (२) भरतपुर उपमहानगरपालिका :- (५३००)
 (३) जनसहभागिता :- (१५००)
 (४) खानेपानी तथा स.स.डि.का. :- (२००)
 (५) शुसासन परियोजना :- (३०००)
 जम्मा रिकम संख्या :- १ आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने थप रकम:- १३०००

(रकम रु. हजारमा)
 ११ आयोजनाको कूल लागत (रु.) : शुरूको ८४२२७
 लागत अनुमान स्विकृत मिति:
 (१) भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड :- ९०००
 (२) भरतपुर नगरपालिका :-
 (३) जनसहभागिता :-
 १२ यस आ व. को खर्च रु. १७४५९
 (१) भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड :- ७११४
 (२) भरतपुर नगरपालिका :- ५३८०
 (३) शुसासन परियोजना :- ३०००
 (४) जनसहभागिता :- १९६५

क्र.सं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाइ	आयोजनाको कूल क्रियापलापको			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गत आ.व. सम्मको			वार्षिक कार्य लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक				प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ व को प्रगति		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्मको		खर्च रु. हजारमा	कैफियत	
			परिमाण	लागत	भार	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित प्रगति	परिमाण	भार	बजेट	कार्य लक्ष्य		प्रगति		परिमाण	भार	परिमाण	भारित प्रगति			
												परिमाण	भार	परिमाण	भार							
१	विस्तृत सर्वे डिजाइन तथा ल.इ.परिमाण	काम	१	२००.००	०.२४				१	०.२४	(२००)	१	०.२४	१	०.२४			१	०.२४	२००	खा पा तथा स स डि	
२	जग्गा उपलब्धी	कटठा	३	६३००.००	७.४८				३	७.४८	५९८५.०० (१११५)					३	७.४८	३	७.४८	५२८५	बोर्ड	
३	डिप टयुबेल निर्माण तथा जडान	गोटा	२	३९६०.००	४.७०				१	२.३५	६००.०० (१५८०)	१	२.३५	१	२.३५	१	२.३५	१	२.३५	५००	बोर्ड	
४	इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण उपलब्धी जडान	प्र.श.	१००	३७१७.००	४.४१				५०	२.२१	५००.०० (१०००)	५०	२.२१	५०	२.२१	५०	२.२१	५०	२.२१	५००	बोर्ड	
५	पाईप, फिटिंग्स तथा औजार उपलब्धी	कि.मी.	३८	१८०९५.००	२१.४८				१३	७.३५	६००.०० (१६००)	६	३.३९	६	३.३९	१३	७.३५	१३	७.३५	५६	बोर्ड	
									(७)		(१५००)					(७)		(७)		१५००	सुमन्ती	
६	पम्प घर निर्माण	गोटा	१००	५०३.००	०.६०				७०	०.४२	४००.००	७०	०.४२	७०	०.४२	७०	०.४२	७०	०.४२	३९६	बोर्ड	
७	ओभरहेड पानी टंकी निर्माण	गोटा	१	१८११५.००	२१.५१																	
१०	कम्पाउन्ड बाल तथा गेट निर्माण)	मिटर	१००	७५६.००	०.९०				३०	०.२७	२४०.००	३०	०.२७	३०	०.२७	३०	०.२७	३०	०.२७			
११	भन्व च्याम्बर निर्माण	गोटा	१६	७१४.००	०.८५																	
८	वितरण पाइपलाइन जडान	कि.मी.	३८	१३६६७.००	१६.२३				१३	५.५५	३००.०० (१२००)	६	२.५६	६	२.५६	१३	५.५५	१३	५.५५	१२०	बोर्ड	
									(७)		(१५००)					(७)		(७)		१२००	ब.उ.म.न.पा.	
									(७)		(१५००)					(७)		(७)		१५००	सुमन्ती	
											(४००)									४००	उपभोक्ता	
९	निजि धारा जडान	गोटा	२०००	१८०००.००	२१.३७				२००	२.१४	(२०००)	२००	२.१४	१००	१.०७			१००	१.०७	४५०	उपभोक्ता	
१२	कन्टिन्जेन्सीज (सानातिना अन्य खर्च)	प्र.श.	१००	२००.००	०.२४				२५	०.०६	६०.००	२५	०.०६	२५	०.०६			२५	०.०६	५७		
	कूल जम्मा			८४२२७.००	१००.००					२८.०६					१३.६३			१२.५७	२५.६३	२६.७२	१७४५९	

तेश्रो चौमासिक प्रगति ९२ %
 वार्षिक प्रगति ९५ %

तयार गर्ने
 बरिष्ठ लेखा सहायक

कार्यकारी निदेशक

तेश्रो चौमासिक र वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन



१. आ.व. :- २०७१/०७२
 २. संस्था :- भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड
 ३. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :- कैलाशनगर खानेपानी आयोजना
 ४. स्थान :- (क) जिल्ला :- चितवन
 (ग) उ.म.न.पा. :- भरतपुर वार्ड नं. १३, १४
 ५. आयोजना शुरू भएको मिति :- २०६८।०६९
 ६. आयोजना पुरा हुने मिति :- २०७२।७३
 आयोजनाबाट लाभान्वित हुने कूल जनसंख्या :- १०३७६

१०. वार्षिक बजेट (रु.) :- १०००
 (१) भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड :- १०००
 (२) भरतपुर नगरपालिका :-
 (३) जनसहभागिता :-

जम्मा स्किम संख्या :- १ आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने थप रकम:-

(रकम रु. हजारमा)
 ११. आयोजनाको कूल लागत (रु.) : शुरूको ४६१५४
 लागत अनुमान स्विकृत मिति:
 (१) भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड :-
 (२) भरतपुर नगरपालिका :-
 (३) जनसहभागिता :-
 १२. यस आ.व. को खर्च रू. २१०९
 (१) भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड :- ९५९
 (२) भरतपुर नगरपालिका :- ३८०
 (३) जनसहभागिता :- ४५०

क्र.सं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	आयोजनाको कूल			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गत			वार्षिक कार्य लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक				प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्मको		खर्च रु. हजारमा	कैफियत	
			क्रियापलापको			आ.व. सम्मको			परिमाण	भार	बजेट	कार्य लक्ष्य		प्रगति		परिमाण	भार	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति			
			परिमाण	लागत	भार	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित प्रगति				परिमाण	भार	परिमाण	भार							
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२१	
१	विस्तृत डिजाइन तथा ल.इ.तयारी	प्र.श.	१००	७०	०.१५	१००	१००	०.१५											१००	०.१५	१००	BNP
२	आयोजना मूल्याङ्कन/सम्झौता	प्र.श.	१००	२०	०.०४	५०		०.०२											५०	०.०२		
३	जग्गा उपलब्धी	कटठा	२	३०००	६.५०	२	३०००	६.५०											२	६.५०	३०००	User
४	आयोजना निर्माण सम्बन्धि तालिमहरू	प्र.श.	१००	१००	०.२२																	
५	डिप टयुबेल निर्माण	गोटा	१	२१२०	४.५९	१	१३००	४.५९											१	४.५९	१३००	BNP
६	इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण उपलब्धी जडान	प्र.श.	१००	२६५४	५.७५	१००	१४६५	५.७५											१००	५.७५	१४६५	BNP
७	पाईप, फिटिंग तथा औजार उपलब्धी	कि.मी.	२७	१३७५.०	२७.७९	११	२८७९	१२.१४	४	४.४१	३५०	३.००	३.३१	३.००	३.३१	४.००	४.४१	१५	१६.५५	३४६५	BWSMB	
							२००				(३८०)										५८०	BNP
८	ओभरहेड पानी टंकी निर्माण	गोटा	१	९०४०	१९.५९																	
९	वितरण पाइपलाइन जडान	कि.मी.	२०	५३००	११.४८	११	१७२२	६.३२	४	२.३०	४५०	३.००	१.७२	३.००	१.७२	४.००	२.३०	१५	८.६१	१९३९	BWSMB	
							५००														५००	BNP
१०	निजि धारा जडान	गोटा	५००	५०००	१०.८३	१००	१४००	२.१७	५०	१.०८	(४५०)	३०.००	०.६५	३०	०.६५	५०	१.०८	१५०	३.२५	१८५०	User	
११	अन्य निर्माण कार्यहरू (वि.पी.टी, भल्व च्याम्बर, कसिङ्ग, पम्पहाउस, कम्पाउन्ड वाल)	प्र.श.	१००	२२००	४.७७	३०	४७०	१.४३	१०	०.४८	१५०	५	०.२४	५.००	०.२४	१०.००	०.४८	४०	१.९१	६१०	BWSMB	
१२	कन्टिन्जेन्सीज	प्र.श.	१००	१०००	२.१७	१०	६२	०.२२	१०	०.२२	५०	५.००	०.११	५.००	०.११	१०.००	०.२२	२०	०.४३	७५		
१३	मूल्य समायोजन कन्टिन्जेन्सीज	प्र.श.	१००	१९००	४.१२																	
	जम्मा			४६१५४	१००.००		१३०९५	३९.२८		८.४९	१०००		६.०३		६.०३		८.४९		४७.७७	१४८८४		

तेश्रो चौमासिक प्रगति १०० %
 वार्षिक प्रगति १०० %

तयार गर्ने:

(Signature)
 बरिष्ठ लेखा सहायक

प्रमाणित गर्ने:

(Signature)
 कार्यकारी निर्देशक



१. आ.ब. :- २००१/०७२
 २. सस्था :- भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड
 ३. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :- बानन्दपुर खा.पा. बा.
 ४. स्थान :- (क) जिल्ला :- चितवन
 (ग) उ.म.न.पा. :- भरतपुर वार्ड नं. १३
 ५. आयोजना शुरू भएको मिति :- २०६८/०६९
 ६. आयोजना पुरा हुने मिति :- २०७३/०७४
 आयोजनाबाट लाभान्वित हुने कूल जनसंख्या :- १०३७६

१०. वार्षिक बजेट (रु.) :- २५००
 (१) भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड - २५००
 (२) भरतपुर उपमहानगरपालिका - २१०००
 (३) जनसहभागिता - १८००
 जम्मा स्किम संख्या :- १ आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने थप रकम:-

(रकम रु. हजारमा)
 ११ आयोजनाको कूल लागत (रु.) : शुरूको ४०१२१
 सागत अनुमान स्विकृत मिति:
 (१) भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड :-
 (२) भरतपुर उपमहानगरपालिका :-
 (३) जनसहभागिता :-
 १२ थप आ व को खर्च रु ५२८६
 (१) भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड :- २४८६
 (२) भरतपुर उपमहानगरपालिका - १०००
 (३) जनसहभागिता - १८००

क्र.सं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाइ	आयोजनाको कूल क्रियापलापको			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गत आ.व. सम्मको			वार्षिक कार्य लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक				प्रतिवेदन अवधिसम्म थप आ व को प्रगति		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्मको		खर्च रु. हजारमा	कैफियत	
			परिमाण	लागत	भार	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित प्रगति	परिमाण	भार	बजेट	कार्य लक्ष्य	प्रगति	परिमाण	भार	परिमाण	भार	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२१	
१	विस्तृत डिजाइन तथा ल.इ.तयारी	प्र.श.	१००	१००	०.२५	१००	१००	०.२५											१००	०.२५	१००	B.N.P.
२	आयोजना मूल्याङ्कन/सम्झौता	प्र.श.	१००	५०	०.१२																	
३	जग्गा उपलब्धी	कटठा	२	२०००	४.९८	२	२०००	४.९८											२	४.९८	२०००	User
४	आयोजना निर्माण सम्बन्धि तालिमहरू	प्र.श.	१००	१००	०.२५																	
५	डिप टयुबेल निर्माण	गोटा	२	४०००	९.९७	१	२०००	४.९८											१	४.९८	२०००	B.N.P.
६	इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण उपलब्धी जडान	प्र.श.	१००	१७५६	४.३८	८०	१४६९	३.५०											८०	३.५०	१४६९	BWSMB
७	पाईप, फिटिंग्स तथा औजार उपलब्धी	कि.मी.	३१	८५००	२१.१९	२	६०४	१.३७	७०	४७८	८००	४०	३४२	५०	३४२	७०	४७८	९	६१५	१९७०	BWSMB	
											(३००)										५००	B.N.P.
८	ओभरहेड पानी टर्की निर्माण	गोटा	१	१००७१	२५.१०																	
९	वितरण पाइपलाइन जडान	कि.मी.	३१	७२००	१७.९५	१५	३६५	०.८७	७०	४०५	१२००	५०	२८९	५०	२८९	७	४०५	८५	४०५	१११२	४६०	BWSMB
							६०				(३००)										५६०	B.N.P.
१०	निजि धारा जडान	गोटा	६८३	२७३२	६.८१	३०	२४०	०.३०	२००	१९९	(१८००)	१५०	१५०	१३०	१३०	१३०	१३०	१६०	५.१८	२०४०	User	
११	अन्य निर्माण कार्यहरू (वि.पी.टी, भल्य च्याम्बर, कुसिङ्ग, पम्पहाउस, क्रम्पाउन्ड वाल)	प्र.श.	१००	२६००	६.४८	६०	६४५	३.८९	२५	१६२	४५०	२०	१३०	२०	१३०	२५	१६२	८५	१.८७	९९७	९९७	BWSMB
१२	कन्टिन्जेन्सीज (सानातिना अन्य खर्च)	प्र.श.	१००	१०१२	२.५२	१०	५०	०.२५	१०	०.२५	५०	५	०.१३	५	०.१३	१०	०.२५	२०	०.२५	७१	७१	BWSMB
१३	मूल्य समायोजन कन्टिन्जेन्सीज	प्र.श.	१००																			
	कूल जम्मा			४०१२१	१००		७५३३	२०.४०		१२७०	२५००		९२३		९०३	१७९.००	१२००		३१.२३	१२८१९		

तेश्रो चौमासिक प्रगति ९७.८ %
 वार्षिक प्रगति ९४.५ %

तयार गर्ने

बरिष्ठ लेखा सहायक

कार्यकारी निर्देशक
 प्रमाणित गर्ने

तेश्रो चौमासिक र वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन



१. आ.व. :- २०७१/०७२
 २. संस्था :- भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड
 ३. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम :- वातावरणीय सरसफाई कार्यक्रम
 ४. स्थान :- (क) जिल्ला :- चितवन
 (ग) उ.म.न.पा. :- भरतपुर
 ५. आयोजना शुरू भएको मिति :- सालवसाली
 ६. आयोजना पूरा हुने मिति :- सालवसाली
 ७. आयोजनाबाट लाभान्वित हुने कूल जनसंख्या :-

१०. वार्षिक बजेट (रु.) :- ५००
 (१) भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड :- ५००
 (२) भरतपुर उपमहानगरपालिका :-
 (३) जनसहभागिता :-
 जम्मा रिकम संख्या :- आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने थप रकम :-

(रकम रु. हजारमा)
 ११. आयोजनाको कूल लागत (रु.) : शुरूको सशोधित.
 लागत अनुमान रिवकृत मिति:
 (१) भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड :- ५००
 (२) भरतपुर उपमहानगरपालिका :-
 (३) जनसहभागिता :-
 १२. यस आ.व. को खर्च रु. ५००
 (१) भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड :- ५००
 (२) भरतपुर नगरपालिका :-
 (३) जनसहभागिता :-

क्र.सं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाइ	आयोजनाको कूल क्रियाकलापको			सम्पूर्ण कार्यमाथे गत आ.व. सम्मको			वार्षिक कार्य लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक				प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्मको		खर्च रु. हजारमा	कैफियत	
			परिमाण	लागत	भार	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित प्रगति	परिमाण	भार	बजेट	कार्य लक्ष्य		प्रगति		परिमाण	भार	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति			
												परिमाण	भार	परिमाण	भार							
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१		
१	सरसफाई सम्बन्धि सुविधा निर्माण, मर्मत संभार तथा संचालन																					
	क) कम्पोष्ट प्याम्बर निर्माण	गोटा	६०	१००	२५				६०	२५	१००	३०	१३	३०	१२.५०	५०	२०.८३	५०	२०.८३			
	ख) सार्वजनिक शौचालय निर्माण	गोटा	१.५	२००	५०				१.५	५०	२००	१	५०	१	५०.००	१.५	५०.००	१.५	५०.००			
२	सरसफाई सम्बन्धि जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन																					
	क) प्रचार प्रसार, सरसफाई अभियान,	प्र.श	१००	५०	१२.५०				१००	१३	५०	६०.००	७.५०	६०.००	७.५०	१००	१२.५०	१००	१२.५०			
	ख) सरसफाई सम्बन्धी तालिम	प्र.श	१००	५०	१२.५०				१००	१३	५०	६०.००	७.५०	६०.००	७.५०	१००	१२.५०	१००	१२.५०			
	जम्मा			४००	१००					१००	४००	१५१	७७.५		७७.५		९५.८३		९५.८३			

तेश्रो चौमासिक प्रगति १००.०० %
 वार्षिक प्रगति ९५.८३ %

तयार गर्ने
 बरिष्ठ लेखा सहायक

कार्यकारी निर्देशक

प्रमाणित गर्ने


बोर्डका विविध गतिविधी सम्बन्धी केही फोटोहरु



धनगाडा खा.पा.आ. को डिप वोरिङ्ग सिलान्यास गर्दै माननिय सभासदज्युहरु श्री कृष्णभक्त पोखेल र श्री गिता वाग्ले




शुसासन परियोजनावाट भ.न.पा. वडा नं. ११ र १२ मा ७ कि.मि. लाईन विस्तार गरी बोर्डलाई हस्तान्तरण गरिदै

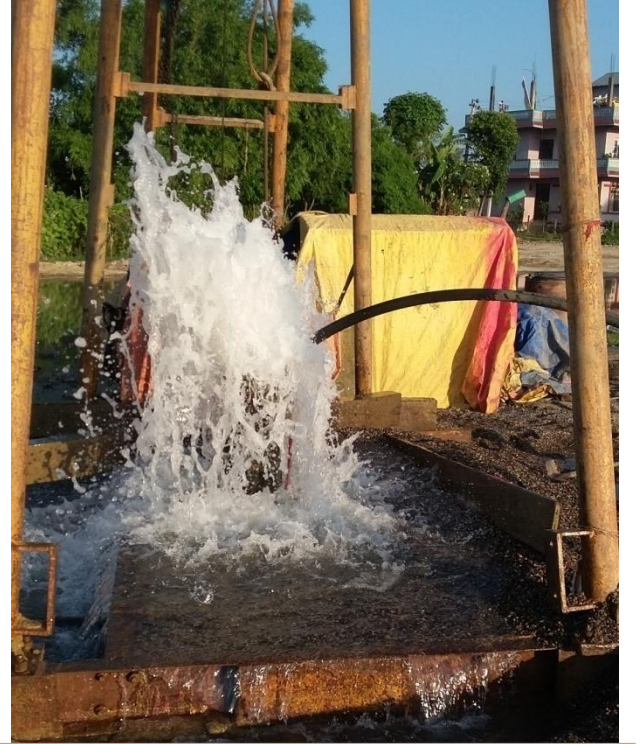

डिप वोरिङ्ग सम्पन्न भई कम्प्रेसर लगाईदै



प्रेमवस्ती कालिका खानेपानी आयोजनाको सम्झौता देखी निर्माण सम्पन्न हन लागेको टंकीको दृश्यहरु

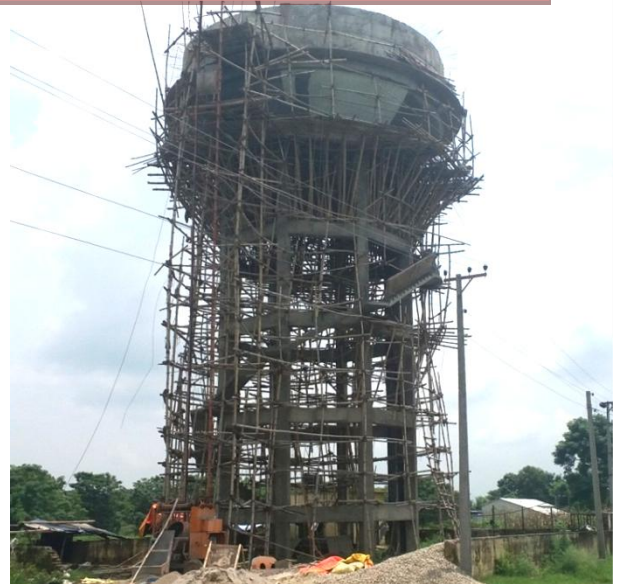

भ.न.पा. २ आँपटारी (माथी) र मालपोत चोक (तल) मा डि.टि.एच. मेसिनबाट डिप वोरिङ गरिदै

मालपोत स्थित नयाँ वेलमा स्यान्ड सेप्रेटर टंकी जडान गरी वेल संचालन गरिएको ।



बोर्डमा हालसालै नियुक्त हुनु भएका ईन्जिनियर टार्विन बस्नेत (बायाँ) र सहायक प्रशासन अधिकृत संजय बराल (दायाँ) आफ्नो नियुक्ती पत्र बुझ्दै



भरतपुर अस्पतालमा भुकम्प पिडित विरामी तथा विरामी कुरुवाहरुको लागि खानेपानीको व्यवस्था मिलाईएको



भुकम्प गएको समयमा केन्द्रिय बसपार्कमा यात्रुहरुको लागि व्यवस्था गरिएको पानीको धारावाट पानी पिउदै यात्रुहरु



२०७२ वैशाख १२ गते गएको विनासकारी भुकम्पका पिडितहरुको लागि बोर्डका कर्मचारीहरु र बोर्डको तर्फवाट आर्थिक सहयोगको चेक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हस्तान्तर गदै बोर्ड सदस्य कल्याण जोशी र वद्री प्रसाद अधिकारी



बोर्डको सेवाक्षेत्र भित्रका विभिन्न उपभोक्ता समितिहरु, बोर्ड र खानेपानी तथा ढल निकास विभाग विचको सम्बन्धलाई कसरी व्यवस्थित र संस्थागत गर्ने भन्ने विषयमा राय सुझाव संकलनको लागि आयोजना गरिएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम



नारायणी नदीको किनारमा सशस्त्र प्रहरी बल र सर्वसाधारणको लागि निर्माण गरिएको २ कोठे सार्वजनिक शौचालयको चापी हस्तान्तरण गर्दै बोर्ड सदस्य कल्याण जोशी



भरतपुर २ आँपटारीमा सर्वसाधारणको लागि निर्माण गरिएको २ कोठे सार्वजनिक शौचालय



पहिले



अहिले



भरतपुर उप-महानगरपालिका र भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको संयुक्त प्रयास पछि भरतपुर उप-नगरपालिका भित्रका विभिन्न स्थानहरूको सरसफाईमा देखिएको परिवर्तन



वातावरणीय सरसफाई सम्बन्धि कार्यक्रमका केही भ्रमक



विद्युत् वातावरण दिवस २०१९ जून ५ को अवसरमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आयोजनामा 'वातावरण मैत्री स्थानीय शासन प्रारम्भ' कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो।



आनन्दपुर खानेपानी आयोजना स्थलमा निर्माण गरिएको कम्पाउण्ड बाल



कैलासनगर वेलमा निर्माण गरिएको प्लेटफर्मको दृश्य



विभिन्न खानेपानी आयोजनाहरूको अवलोकन भ्रमणको एक दृश्य
